

Fonds de Promotion de l'Industrie
Cellule de Gestion des Projets et de Passation des marchés Publics « CGPMP »
Ouverture de pli Financier

**PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DE PLI FINANCIER RELATIF AU RECRUTEMENT
D'UN CONSULTANT (Firme) CHARGE DE L'ETUDE, DU CONTRÔLE ET DE LA
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE 30 KM DE
NDOMBA-RN1 DANS LA PROVINCE DU KASAI-ORIENTAL.**

DP N°007/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC

L'an deux mil vingt et un, le **vingt-Huitième jour du mois de janvier**, nous, membres de la Commission des marchés constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à l'ouverture du pli financier relatif à la mission en exergue. La séance a eu lieu à 16h 30 00' dans la salle de réunions du FPI.

I. Présences

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Boniface KASEMBE | Directeur Générale Adjoint | Président |
| André ILALI | Directeur des Projets | Membre |
| Fifi MOBHE | Directeur Financier | Membre |
| MAHESHE MWANANTEBA | Représentant la DRH | Membre |
| Hans ILUNGA | Représentant la DPL | Membre |
| Issia WALENGANI | Représentant la DJR | Membre |
| FARIALA MUSIGWA | Représentant la DET | Membre |
| Mado PULUSI | Spécialiste en passation des marchés | membre |
| Robert BUSHIRI | Chargé de passation des marchés | secrétaire |

II. Introduction

La situation de crise sanitaire provoquée par la covid 19 contraint chaque Gouvernement à réagir rapidement par la mise en place des stratégies de mitigations des effets induits.

C'est dans ce cadre que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la covid-19 dans certaines provinces à fort apport dans le produit intérieur Brut de pays et celles fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.

Pour la mise en œuvre d'une partie de ces projets, le Gouvernement a sollicité la contribution du Fonds de Promotion de l'Industrie.

C'est dans ce cadre qu'à la suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 20 août 2020 sur le projet de Demande de Proposition (DP) n°007/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC et sur la liste restreinte, ledit document relatif au recrutement d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo a été transmis le 25 août 2020 aux cabinets repris sur la liste restreint. Il s'agit de : Groupement

Tropiques Architecture/Black-Thari, Groupement Espace Tropical SCET-TUNISIE et Grand International Group LLC.

A la séance d'ouverture des plis organisée le mardi 15 septembre 2020 à 15h30', le FPI a réceptionné deux (2) plis contenant les propositions techniques et financières des cabinets **Grand International Group LLC et Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari**. Les offres techniques ont été remises à la Commission d'Analyse tandis que les offres financières ont été scellées et gardées dans le coffre-fort du FPI.

A l'issue de l'évaluation de toutes les deux propositions techniques, les soumissionnaires ont obtenu les scores repris dans le tableau ci-après :

| N° | Firme | Score technique | Observation |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | 85,50 | 1 ^{er} |
| 2 | Grand International Group LLC | 79,77 | 2 ^e |

III. Déroulement de la séance

A la séance d'ouverture de pli financier organisée le jeudi 28 janvier 2021 à 16h 30 00' dans la salle de réunion du FPI en présence des personnes dont les noms sont repris ci-haut, les informations suivantes ont été lues à haute voix et enregistrées:

| N° | Firme | Montant de l'offre | Observation |
|----|---|---|-------------|
| 1 | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | 3.413.482.600,00 CDF TTC soit 1.706.741,30 USD TTC | RAS |

La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Kinshasa, le 28 Janvier 2021

André ILALI

Membre

MAHESHE MWANANTEBA

Membre

Boniface KASEMBE

Président

Fifi MOBHE

Membre

0 1 8

Issia WALENGANI

Membre

Hans ILUNGA

Membre

FARIADA MUSIGWA

Membre

Mado PULUSI

Membre

Robert BUSHIRI

Secrétaire

**PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ANALYSE COMBINEE DES
PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES RELATIF A LA
SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L'ETUDE, DU
CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA ROUTE DE 30 KM DE NDOMBA RN1 DANS LA PROVINCE DE KASAÏ-
ORIENTAL
2^{ème} ETAPE
DP N° 007/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC**

L'an deux mil-vingt-un, le **vingt-neuvième jour du mois de janvier**, nous, membres de la Commission d'Analyse constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à l'évaluation combinée des propositions techniques et financières relatives au recrutement mieux identifié en exergerue.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE

La Commission d'analyse mise en place est composée des personnes ci-après :

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Mado PULUSI | Secrétaire Permanente | Présidente |
| MUBA WA MWEPU | Représentant du Directeur des Etudes | Membre |
| PEMBE RAISSA LINA | Conseiller juridique | Membre |
| Mina PASI | Chargé de passation des marchés | Sécretaire |

2. INTRODUCTION

La Pandémie de la maladie à corona virus, de par sa virulence et son mode de transmission, a amené le Gouvernement à prendre des mesures pour contrer sa propagation, lesquelles ont eu pour conséquence de ralentir drastiquement l'activité économique.

C'est dans ce contexte que l'une des stratégies du programme suscité prévoit le soutien à la stabilité macro-économique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre des mesures adaptées et l'appui aux activités économiques indispensables et susceptible d'atténuer le choc du à la pandémie, l'encadrement des secteurs productif et la promotion des infrastructures structurantes et industrialisantes.

A ce titre le FPI a reçu la mission de soutenir la relance de l'activité économique dans le cadre de ses interventions traditionnelles il s'agit des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la COVID 19 dans certaine province à fort apport dans le produit intérieur Brut du pays et celle fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.



Par sa lettre N° CAB/MIN/FINANCES/COOP/YMM/2020/1996 du 19 Août 2020, le ministre des finances a autorisé le FPI de mobiliser les ressources extérieures en vue de la réalisation des dites infrastructures structurantes et industrialisantes.

Cette stratégie passe par la mise en place d'un vaste programme appelé « Programme de désenclavement et de connectivité des provinces du Grand Kasai à la ville de Kinshasa et la province du Kongo Central »

Ce consortium consiste à la réalisation des différents projets par les entreprises Egyptiennes, notamment pour effectuer des paiements au titre du marché de la mission d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 30 Km de NDOMBA RN1 dans la province du Kasai Oriental.

C'est dans ce cadre qu'à la suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 20 août 2020 sur le projet de Demande de Proposition (DP) n°007/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC et sur la liste restreinte, ledit document relatif au recrutement d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 30 Km de NDOMBA RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo a été transmis le 25 août 2020 aux cabinets repris sur la liste restreint. Il s'agit de : Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari, Groupement Espace Tropical SCET-TUNISIE et Grand International Group LLC.

A la séance d'ouverture des plis organisée le mardi 15 septembre 2020 à 15h30', le FPI a réceptionné deux (2) plis contenant les propositions techniques et financières des cabinets Grand International Group LLC et Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari. Les offres techniques ont été remises à la Commission d'Analyse tandis que les offres financières ont été scellées et gardées dans le coffre-fort du FPI.

A l'issue de l'évaluation de toutes les deux propositions techniques, les soumissionnaires ont obtenu les scores repris dans le tableau ci-après :

| N° | Firme | Points obtenus | Observation |
|----|---|----------------|-----------------|
| 1 | Grand International Group LLC | 78,77 | 2 ^e |
| 2 | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | 85,503 | 1 ^{er} |

Le score technique minimum de qualification tel qu'indiqué dans la demande de propositions est de 80 points. Au regard des résultats repris ci-dessus, seul le cabinet **Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari** a été qualifié pour l'ouverture de son pli financier.

En accord avec le candidat et suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 27 janvier 2021, le FPI a organisé le 28 janvier 2021 à 16H30' la séance publique d'ouverture dudit pli financier.

Au cours de ladite séance d'ouverture, les informations suivantes ont été lues à haute voix et enregistrées :

| N° | Firme | Montants lus | Scores techniques (%) |
|----|---|---|-----------------------|
| 1 | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | 3.413.482.600,00 CDF TTC soit 1.706.741,30 USD TTC | 85,50 |

alb *hal* *aj* 7 2

3.2 METHODOLOGIE

Les différentes étapes de méthodologie de travail adoptée par la commission d'évaluation se présentent de la manière suivante :

- ▲ Examen de la conformité administrative des propositions financières
- ▲ Vérification arithmétique des offres financières en vue de corriger les éventuelles erreurs de calcul ;
- ▲ Harmonisation des propositions financières par rapport aux propositions techniques déjà évaluées ;
- ▲ Ajustement des propositions financières des soumissionnaires entre elles ;
- ▲ Détermination et conversion en une seule monnaie des propositions financières ajustées ;
- ▲ Détermination des scores combinés.

4. RESULTATS DE L'EVALUATION

4.1 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE

| Formulaire | | Commentaires |
|------------|-------|---|
| | | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari |
| Activités | FF 01 | Lettre de soumission de la proposition financière conforme |
| | FF 02 | Etat récapitulatif des coûts (en USD) fourni et conforme |
| | FF 03 | Ventilation des coûts par activité (en USD) fournie et conforme |
| | FF 04 | Ventilation des rémunérations (en USD) fournie et conforme |
| | FF 05 | Ventilation des autres coûts (en USD) fournie et conforme |

A l'issue de l'examen de la conformité administrative, la proposition financière de **Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari** a été jugée conforme et admise pour la suite de l'évaluation.

4.2 VÉRIFICATION ARITHMÉTIQUE

| Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari |
|---|
| Proposition initiale : 1.706.741,30 USD |
| La proposition financière indique le tableau des coûts unitaires appliqués pour le personnel clé de la mission. Le calendrier du personnel tel qu'indiqué dans la proposition technique permet de relever les niveaux d'efforts de chaque expert et par conséquent de vérifier les montants de rémunération proposés par le cabinet. Le temps de prestation par activité annoncé dans la proposition technique est en harmonie avec le temps facturé dans l'offre financière. |
| Au cours de la vérification numérique, il a été constaté que le coût toutes taxes comprises du Consultant intègre les impôts à sa charge pour un montant total de 296.209,30 \$US. Après correction, le montant TTC de sa proposition financière est évaluée à : 1.706.741,30 \$US – 296.209,30 \$US – 2 \$US. Il y a aussi une erreur de de saisie de 80 USD sans incidence sur le coût. |
| Aucune incohérence n'a été décelée entre la proposition technique et la proposition financière. Le montant de la proposition financière est : 1.410.530,00 \$US |
| Proposition corrigée : 1.410.530,00 USD |

clb Ad G 7

4.3 SCORES COMBINES

| CABINET | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | |
|--|---|--|
| Rémunérations total pour les deux volets | 1 114 730,00 | |
| Corrections | - | |
| Sous-total 1 | 1 114 730,00 | |
| Frais remboursables total pour les deux volets | 295 800,00 | |
| Corrections | 0,00 | |
| Sous-total 2 | 295 800,00 | |
| Total en USD | 1.410.530,00 | |
| Total Montant Hors Taxes | 1.410.530,00 | |
| Total Hors Taxes corrigé | 1.410.530,00 | |
| Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) | 225.684,80 | |
| Montant Toutes Taxes Comprises corrigé | 1.636.214,80 | |

| Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| Remunerations | 1 114 730,00 | |
| Corrections | 0,00 | |
| Sous-total 1 | 1 114 730,00 | |
| Frais remboursables | 295 800,00 | |
| Corrections | 0,00 | |
| Sous-total 2 | 295 800,00 | |
| Total en USD | 1.410.530,00 | |
| Total corrections | 0,00 | |
| Montant corrigé HT | 1.410.530,00 | |
| Score technique | Score tech. pondéré | Score technique |
| 100 | 59,85 | 85,50 |
| Score financier | Score financier pondéré | Score financier |

Pour information

i) Score financier =
100 x (proposition financière moins disante / proposition financière considérée)

ii) Score technique pondéré = 0,70 x score technique

iii) Score financier pondéré = 0,30 x score financier

iv) Score combiné = somme des scores technique et financier pondérés

v) Proposition financière moins disante = celle de **Groupement**

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| Score total | 89,85 | |
| Classement | 1 ^{er} | |

5. CONCLUSION

Au regard des résultats de l'évaluation ci-dessus et de la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût indiquée dans la demande des propositions, la Commission d'analyse propose à la Commission des marchés d'attribuer le marché de consultant chargé de l'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 30 Km de NDOMBA RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo au cabinet **Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari** pour un montant à négocier ne dépassant pas **1.410.530,00 USD HT (Un million quatre cents dix mille cinq cents trente dollars américains Hors Taxes) soit 1.636.214,80 USD TTC.**

Les travaux se sont déroulés normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé.

Fait à Kinshasa, le 29/01/2021.

Mado PULUSI

Présidente



MUBA WA MWEPU

Membre



PEMBE RAISSA LINA

Membre



Mina PASI

Secrétaire



ANNEXES

116

7

Ad Cy

| Poste | Coûts en USD | Coût en \$US corrigé |
|---|--------------|----------------------|
| Coût total de la proposition financière ¹ | | |
| Etudes | 323 780,00 | 323 780,00 |
| Surveillance et contrôle des travaux | 1 086 750,00 | |
| Prix total de la proposition financière (HT) | 1 410 530,00 | |
| Impôts indirects dans le pays du Client estimés - à examiner et finaliser lors de négociation du contrat (en cas d'attribution) | | |
| (1) IBP 14 % | 197 472,20 | |
| 0,7 % taxe de régulation | 98 737,10 | |
| Prix total toute taxe comprise TTC | 1 706 741,30 | 296 209,30 |





| Groupe d'activités (Étapes) ² | | Description ³ | Description corrigée | Coût en \$US corrigé |
|--|--------------------------|--|---|--------------------------------|
| Eléments du coût (Études) | | | | |
| Rémunération ⁴ | | 205 400,00 | 205 480,00 | 80,00 |
| Frais remboursables ⁴ | | 118 300,00 | 118 300,00 | - |
| Total partiel 1 | | 323 780,00 | 323 780,00 | - |
| Eléments du coût (Surveillance et contrôle de travaux) | | | | |
| Rémunération ⁴ | | 909 250,00 | 909 250,00 | - |
| Frais remboursables ⁴ | | 177 500,00 | 177 500,00 | - |
| Total partiel 2 | | 1 086 750,00 | 1 086 750,00 | - |
| Total général HT (1)+(2) | | 1 410 530,00 | 1 410 530,00 | - |
| Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) | | 225 684,80 | 225 684,80 | - |
| Total général TTC | | 1 636 214,80 | 1 636 214,80 | - |
| 1. VOLET ETUDE | | | | |
| Groupe d'activités (Étapes) : Etudes | | Temps passés/travants ⁵ | | Coût en \$US |
| N° | Nom ² | Poste ³ | Taux de rémunération Personne/mois ⁴ | Personne/mois |
| Personnels-clés | | | | |
| 1 | MONCEUR NAIM | Chef de mission | Siège Terrain | 7 500,00 0,43 |
| 2 | KENGA MASHINDA JEAN | Ir Routier | Siège Terrain | 6 500,00 0,43 |
| 3 | ANDRIAAN JACOBUS DELANGE | Economiste des transports | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 4 | PETER KRIKK | Géotechnicien | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 5 | MA YOYE POPY KANGUDI | Hydraulicien | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 6 | CEDRIC MALUNGIDI | Ingénieur spécialiste en ouvrage d'art | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 7 | HANCOCKS PETER GRAHAM | Ingénieur génie rural | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 8 | JEAN BENOIT KABANGU KA | Topographe | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 9 | JONATHAN MA YOMBO | Expert en sécurité routière | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| 10 | MBUTABUTA NKURA XAVIER | Environnementaliste | Siège Terrain | 4 500,00 0,43 |
| Sous-total | | | | 186 100,00 |
| | | | | 186 100,00 ⁸ |

| AUTRES PERSONNELS | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|--|--|-----------|------------|
| AP-1 | Arimathé MONGU | Secrétaire | Siège Terrain | 2 500,00 | 5 | | | 12 500,00 | |
| AP-2 | A pourvoir | Chauffeur 1 | Siège Terrain | 1 000,00 1 000,00 | 4,3 0,43 | | | 4 730,00 | |
| AP-5 | A pourvoir | Aide Topographe 1 | Siège Terrain | 2 500,00 | 0,43 | | | 1 075,00 | |
| AP-6 | A pourvoir | Aide Topographe 2 | Siège Terrain | 2 500,00 | 0,43 | | | 1 075,00 | |
| Sous-total autres personnels | | | | | | | | | 19 380,00 |
| Coûts totaux | | | | | | | | | 205 480,00 |

Formulaire FF-05. Ventilation des frais remboursables

| Groupe d'activités | Description ² | Unité | Coût unitaire ⁵ USD | Quantité | Coût total en USD | Coût en \$US corrigé |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | Perdiem pour personnels en mission | ftt | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Essai géotechnique | ftt | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Location véhicule | jrs | 200,00 | 14 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 4 | Voyages internationaux | Billet A/R avec taxe | 1 200,00 | 5 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 5 | Voyages nationaux | Billet A/R avec taxe | 1 100,00 | 10 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6 | Communication | mois | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7 | Production rapport trimestriel et frais | ftt | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Total | | | | | 118 300,00 | 118 300,00 |
| | | | | | | 323 780,00 |

| 2. VOLET CONTRÔLE ET SURVEILLANCE | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------|--------------|--|-------------------|
| Groupe d'activités (Étapes) : Etudes | | | | | | | | | |
| N° | Nom ² | Poste ³ | Taux de rémunération Personne/mois ⁴ | | Temps passé Intraits ⁵ Personne/mois | | Coût en \$US | | |
| Personnels-clés | | | | | | | | | |
| 1 | MONCEUR NAIM | Chef de mission | Siège Terrain | 6 000,00 6 000,00 | 9,5 10,5 | 120 000,000 | | | 120 000,00 |
| 2 | KENGA MA SHINDA JEAN | Ir Routier | Siège Terrain | 5 000,00 4 000,00 | 19,5 4,5 | 97 500,000 | | | 97 500,00 |
| 3 | ANDRIAN JA COBUS DELANGE | Economiste des transports | Siège Terrain | | | 18 000,000 | | | 18 000,00 |
| 4 | PETER KRIKK | Géotechnicien | Siège Terrain | 4 000,00 | 19,5 | 78 000,000 | | | 78 000,00 |
| 5 | MA YOYE POPY KANGUDI | Hydraulicien | Siège Terrain | 4 000,00 | 18 | 72 000,000 | | | 72 000,00 |
| 6 | CEDRIC MALUNGIDI | Ingénieur spécialiste en ouvrage d'art | Siège Terrain | 4 000,00 | 18 | 72 000,000 | | | 72 000,00 |
| 7 | HANCOCKS PETER GRAHAM | Ingénieur génie rural | Siège Terrain | 4 000,00 | 19,5 | 78 000,000 | | | 78 000,00 |
| 8 | JEAN BENOIT KABANGU KA | Topographe | Siège Terrain | 4 000,00 | 19,5 | 78 000,000 | | | 78 000,00 |
| 9 | JONATHAN MA YOMBO | Expert en sécurité routière | Siège Terrain | 4 000,00 | 13 | 52 000,000 | | | 52 000,00 |
| 10 | MBUTABUTA NKURA XAVIER | Environnementaliste | Siège Terrain | 4 000,00 | 19,5 | 78 000,000 | | | 78 000,00 |
| | Sous-total | | | | | 743 500,000 | | | 743 500,00 |
| AUTRES PERSONNELS | | | | | | | | | |
| AP-1 | Arimathé MONGU | Secrétaire | Siège Terrain | 2 500,00 | 19,5 | 48 750,000 | | | 48 750,00 |
| AP-2 | A pourvoir | Chauffeur 1 | Siège Terrain | 1 000,00 | 19,5 | 19 500,000 | | | 19 500,00 |
| AP-5 | A pourvoir | Aide Topographe 1 | Siège Terrain | 2 500,00 | 19,5 | 48 750,000 | | | 48 750,00 |
| AP-6 | A pourvoir | Aide Topographe 2 | Siège Terrain | 2 500,00 | 19,5 | 48 750,000 | | | 48 750,00 |
| | Sous-total autres personnels | | | | | 165 750,00 | | | 165 750,00 |
| | Coûts totaux | | | | | 909 250,00 | | | 909 250,00 |

| Groupe d'activités (Étapes) : Surveillance et contrôle | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| N° | Description ² | Unité | Coût unitaire ⁵ USD | Quantité | Coût total en USD | Coût en \$US corrigé |
| 1 | Perdiem pour personnels en mission | fft | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Essai géotechnique | fft | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Achat véhicule | pc | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4 | Voyages internationaux | Billet A/R avec taxe | 1 200,00 | 5 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 5 | Voyages nationaux | Billet A/R avec taxe | 1 100,00 | 20 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6 | Communication | Mois | 300,00 | 24 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 7 | Production rapport mensuel et frais d'expédition | Unité | 100,00 | 24 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 8 | Production rapport trimestriel et frais d'expédition | Unité | 166,67 | 6 | 1 000,00 | 1 000,02 |
| 9 | Production rapport provisoire et frais d'expédition | Unité | 400,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | Production rapport définitif et frais d'expédition | Unité | 500,00 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Amortissement matériels topographique | Mois | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total | | | | 177 500,00 | 177 500,02 |

F.P.I. DIRECTION GENERALE

CGPMP
COMMISSION DE MARCHES

PROCES-VERBAL DE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ANALYSE RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (CABINET) CHARGE DE L'ETUDE, DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE 30 KM DE NDOMBA RN1 DANS LA PROVINCE DU KASAI- ORIENTAL

DP 007/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC

L'an deux mil vingt et un, le vingt-deuxième jour du mois de janvier, nous, membres de la Commission de Marchés instituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir examiné le rapport de la Commission d'Analyse relatif au marché mieux identifié en exergue.

1. PRESENCE

Etaient présents

Pour la Commission des Marchés

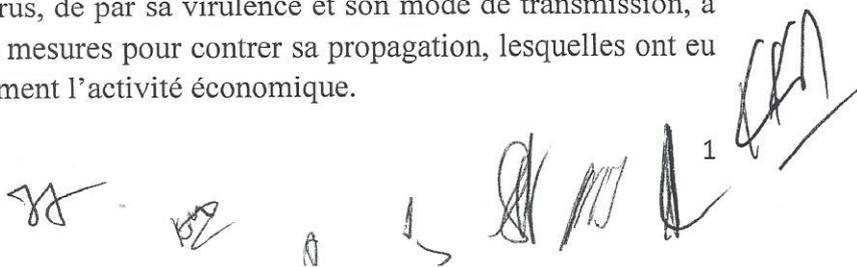
| | | |
|--------------------|---|------------|
| Patrice KITEBI | Directeur Général | Président |
| Boniface KASEMBE | Directeur Général Adjoint | Membre |
| André ILALI | Directeur des Projets | Membre |
| Willy LOKONGO | Directeur du Patrimoine et de la Logistique | Membre |
| MAHESHE MWANANTEBA | Représentant de la DRH | Membre |
| Colette KISIMBA | Directeur Financier Adjoint | Membre |
| Kathia MUNKOKO | Représentant la Direction des Etudes | Membre |
| Robert BUSHIRI | Chargé de passation des marchés de la CGPM | Secrétaire |

Pour la Commission d'analyse

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Pascaline MBOTIKA | Expert en Passation des Marchés | Président |
| Mado PULUSI | Spécialiste en Passation des Marchés | Membre |
| François MPUILA | Directeur Adjoint aux Etudes | Membre |
| Mina PASI LIBANDA | Chargée de Passation des Marchés | Secrétaire |

2. INTRODUCTION

La pandémie de la maladie à coronavirus, de par sa virulence et son mode de transmission, a amené le Gouvernement à prendre des mesures pour contrer sa propagation, lesquelles ont eu pour conséquence de ralentir drastiquement l'activité économique.



C'est dans ce contexte que l'une des stratégies du Programme suscité prévoit le soutien à la stabilité macro-économique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre des mesures adaptées et l'appui aux activités économiques indispensables et susceptible d'atténuer le choc dû à la pandémie, l'encadrement des secteurs productifs et la promotion des infrastructures structurantes et industrialisantes.

C'est à ce titre que le FPI a reçu la mission de soutenir la relance de l'activité économique dans le cadre de ses interventions traditionnelles. Il s'agit des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la COVID 19 dans certaines provinces à fort apport dans le Produit Intérieur Brut du pays et celles fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.

La demande de proposition DP 007/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC relatif au recrutement susmentionné a été envoyée à partir du 26 Août 2020 aux cabinets ci-après : **GROUPEMENT TROPIQUES ARCHITECTURE/BLACK-THARI, GROUPEMENT ESPACE TROPICAL SCET-TUNISIE et GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC.**

A la date limite de dépôt de demandes de Propositions(DP), soit le mardi 08 Septembre 2020, deux (2) manifestations d'intérêt ont été réceptionnées par le FPI.

A la séance d'ouverture des plis organisée le mardi 08 Septembre 2020 à 15h30' dans la salle de réunion du FPI, les informations suivantes ont été lues et enregistrées :

| N° | Firmes | Observation |
|----|--|-------------|
| 1 | Groupement Tropic Architecture/Black-Thari | RAS |
| 2 | Grand International Group LLC | RAS |

3. EVALUATION DES OFFRES

Les travaux d'analyse des manifestations d'intérêt des 2 dossiers de candidatures ont abouti aux résultats suivants :

A l'issue de l'évaluation des toutes les manifestations d'intérêt réceptionnées, les notes obtenues par les cabinets ou groupements des cabinets se présentent comme suit :

| N° | FIRMES | NOTES | CLASSEMENT |
|----|--|-------|------------|
| 1 | Groupement Tropic Architecture/Black-Thari | 85,50 | 1er |
| 2 | Grand International Group LLC | 78,77 | 2ème |

Sur base des résultats repris ci-dessus, la Sous-Commission d'Analyse a proposé la liste restreinte composée d'un seul candidat ayant réalisé le score technique supérieur à 80%. Il s'agit de :

| N° | FIRMES | NOTES | CLASSEMENT |
|----|---|-------|------------|
| 1 | Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari | 85,50 | 1er |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

4. AVIS ET CONSIDERATIONS

Lors de l'examen du rapport de la Sous-Commission d'Analyse, la Commission des Marchés a soulevé la préoccupation relative à la capacité du cabinet Groupement Tropic Architecture/Black-Thari et son expérience pertinente à réaliser cette mission.

La Commission d'Analyse a précisé à la Commission des Marchés sur les expériences du Groupement présentées dans leur proposition technique et détaillé dans le rapport d'analyse.

5. DECISION DE LA COMMISSION DES MARCHES

De ce qui précède, après débats et délibérations, la Commission de marchés a validée les résultats de l'évaluation de la DP proposée par la Commission d'Analyse en vue de procéder à l'ouverture du pli financier du Cabinet **Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari** ayant réalisé le score technique supérieur à 80%, ceci après avis de non objection de la DGCMP sur le rapport d'évaluation.

La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Kinshasa, le 22 Janvier 2021


Boniface KASEMBE


Membre


Willy LOKONGO


Membre

MAHESHE MWANANTEBA


Membre

Kathia MUNKOKO


Membre

Patrice KITEBI


Président

André ILALI


Membre

Colette KISIMBA


Membre

Robert BUSHIRI


Secrétaire
